

СЕНТЯБРЬ 2026

FITSTORY

Требования, роли, сценарии, модули, границы MVP, wireframes,
архитектура, сроки и бюджет



ИТОГ ЭТАПА

Этап Discovery закрыт

Собраны и зафиксированы требования, определены роли и их зоны ответственности, описан пользовательский путь, платформа разложена на модули, проведена граница MVP, собраны wireframes всех ключевых экранов, спроектирована техническая архитектура и посчитаны сроки и бюджет.

104

экранов в макетах

49 мобильных, 26 веб, 29 в кабинетах
команды

6

ролей

Плюс маппинг на список из брифа

7

модулей платформы

Плюс общее ядро

3

AI-функции в MVP

Ещё 3 распределены по следующим этапам

≈ 5 мес

объём MVP

5 170 часов работы

≈ 8-9 мес

полная реализация

9 091 час работы

Требования собраны серией рабочих созвонов

БЛОК	ЧТО РАЗБИРАЛИ
Вводная сессия	Продукт, рынок, бизнес-модель, ожидания от MVP
Роли и операционная модель	Кто работает в платформе, зоны ответственности, эскалации
Пользовательский путь	Онбординг, тренировки, питание, подписка
Работа с тренером	Чат, звонки, разбор питания, кураторство
Монетизация и магазин	Тарифы, триал, инвентарь, доставка
AI-функции	Что делает AI, где границы ответственности
Интеграции и данные о здоровье	Health, сторы, платежи, требования рынка США
Ревью макетов	Прохождение экранов, сбор правок
Итоговая сверка	Границы MVP, сроки, бюджет

По итогам встреч собраны рабочие документы: карта интеграций с обоснованием каждого сервиса, объём AI-функций, техническая база по уведомлениям и алёртингу, разбор подключения Health и Watch.

В платформе шесть ролей

Клиент (подписчик) Мобильное приложение и веб · F01-F47, W01-W26 Свой профиль, тренировки, питание, чат с тренером, подписка, заказы	Тренер Веб-кабинет в полной реализации · T1-T7 Свои клиенты, программы недели, чаты, разборы питания, звонки, заявки в студию	Куратор Веб-кабинет · K1-K7 Очередь отчётов, карточки клиентов, live-мониторинг сессий, психотесты, эскалации
Контент-студия Веб-кабинет · S1-S4 Пайплайн производства, метаданные тренировок, модерация и публикация, база еды	Администратор Веб-кабинет · A1-A10, S8 Метрики, подписки и биллинг, товары и склад, заказы, настройки платформы, роли и права	Поддержка Веб-кабинет · Через кабинет админа Карточка клиента, платежи, технические обращения, временный доступ к переписке

Разграничение доступа заложено на уровне базы данных, а не в коде приложения: тренер не получает чужого клиента, куратор не видит биллинг, поддержка не читает переписку без выданного доступа.

11 разрешений на 6 ролей

	ПОДПИСЧИК	ТРЕНЕР	КУРАТОР	СТУДИЯ	АДМИН	ПОДДЕРЖКА
Профиль клиента	полный	частично	частично			частично
Программа тренировок	частично	полный	частично			
Переписка	полный	частично	по выдаче			по выдаче
Данные о здоровье	полный	частично	частично			
Питание и разборы	полный	полный	частично			
Биллинг и подписки	частично				полный	частично
Каталог контента	частично	полный	частично	полный	полный	
Публикация контента				полный	частично	
Товары и заказы	частично				полный	частично
Настройки платформы					полный	
Роли и права					полный	


66

правил: 11
разрешений на 6
ролей. В MVP
политики пишутся
для 5 ролей, на
каждое право свой
автотест

**Временный
доступ к
переписке**

Выдаётся куратором
на срок. Клиент
видит пометку,
каждое открытие
пишется в журнал

Путь клиента от входа до работы с тренером

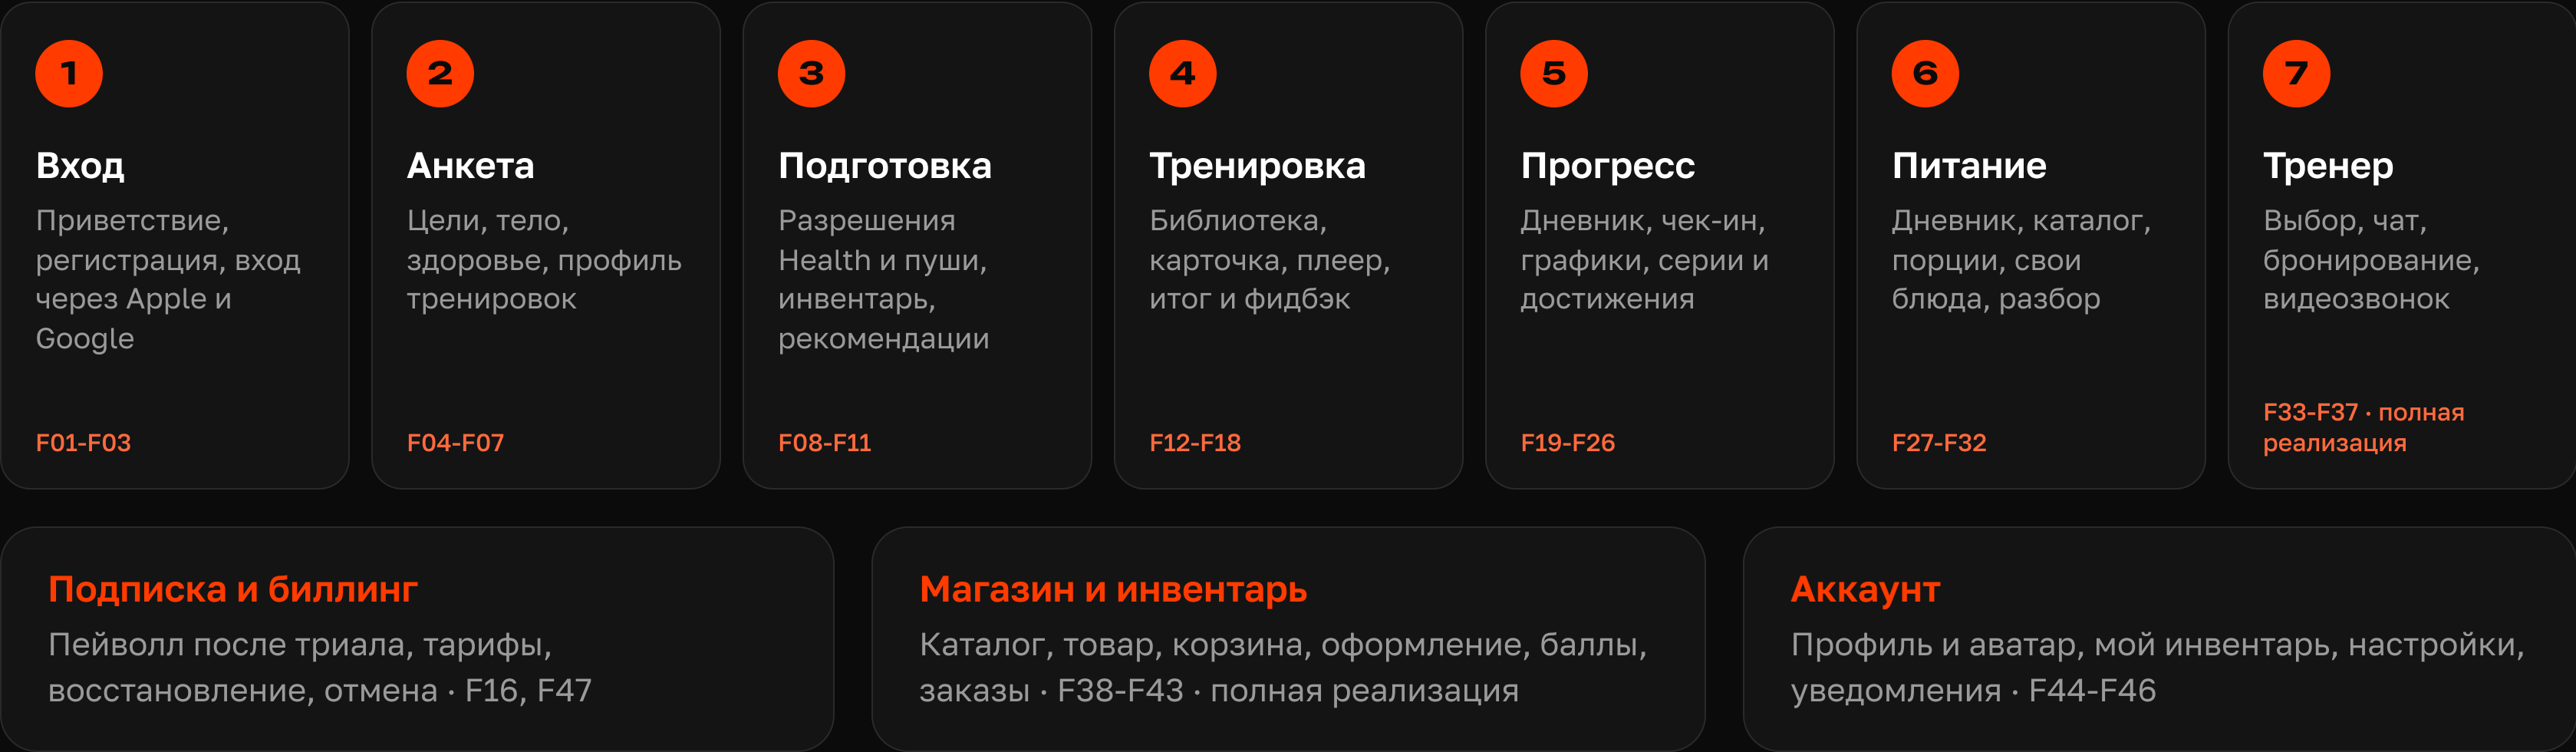


47 экранов в основном флоу, 2 вынесены за флоу.

Десять этапов пути клиента в приложении и вебе

№	ЭТАП	СОДЕРЖАНИЕ	МОБИЛЬНЫЕ	ВЕБ
1	Вход	Приветствие, регистрация, вход через Apple и Google	F01-F03	W01
2	Анкета	Цели, параметры тела, здоровье и ограничения, профиль тренировок	F04-F07	W01-W02
3	Подготовка	Разрешения Health и уведомлений, инвентарь, благодарность и рекомендации тренера	F08-F11	W03, W06-W07
4	Первая тренировка	Библиотека, карточка, плеер с фазами, силовой блок, итог и фидбэк	F12-F18	W08-W10
5	Прогресс	Дневник тренировок, ежедневный чек-ин, графики, сила, челленджи, до и после	F19-F26	W18, W22
6	Питание	Дневник, каталог и поиск, карточка продукта, своё блюдо, разбор тренером	F27-F32	W19-W21
7	Работа с тренером	Выбор тренера, карточка, чат, бронирование, видеозвонок	F33-F37	W13-W17
8	Подписка	Пейволл после триала, тарифы, отмена подписки	F16, F47	W11
9	Магазин	Каталог, товар, корзина, оформление, баллы, заказы	F38-F43	W24
10	Аккаунт	Профиль и аватар, мой инвентарь, настройки	F44-F46	W25-W26

Помимо основного пути зафиксированы сценарии операционных ролей: разбор очереди отчётов куратором, ведение программы недели тренером, производство и модерация контента студией, работа администратора с метриками, складом и заказами.

Семь модулей платформы и общее ядро

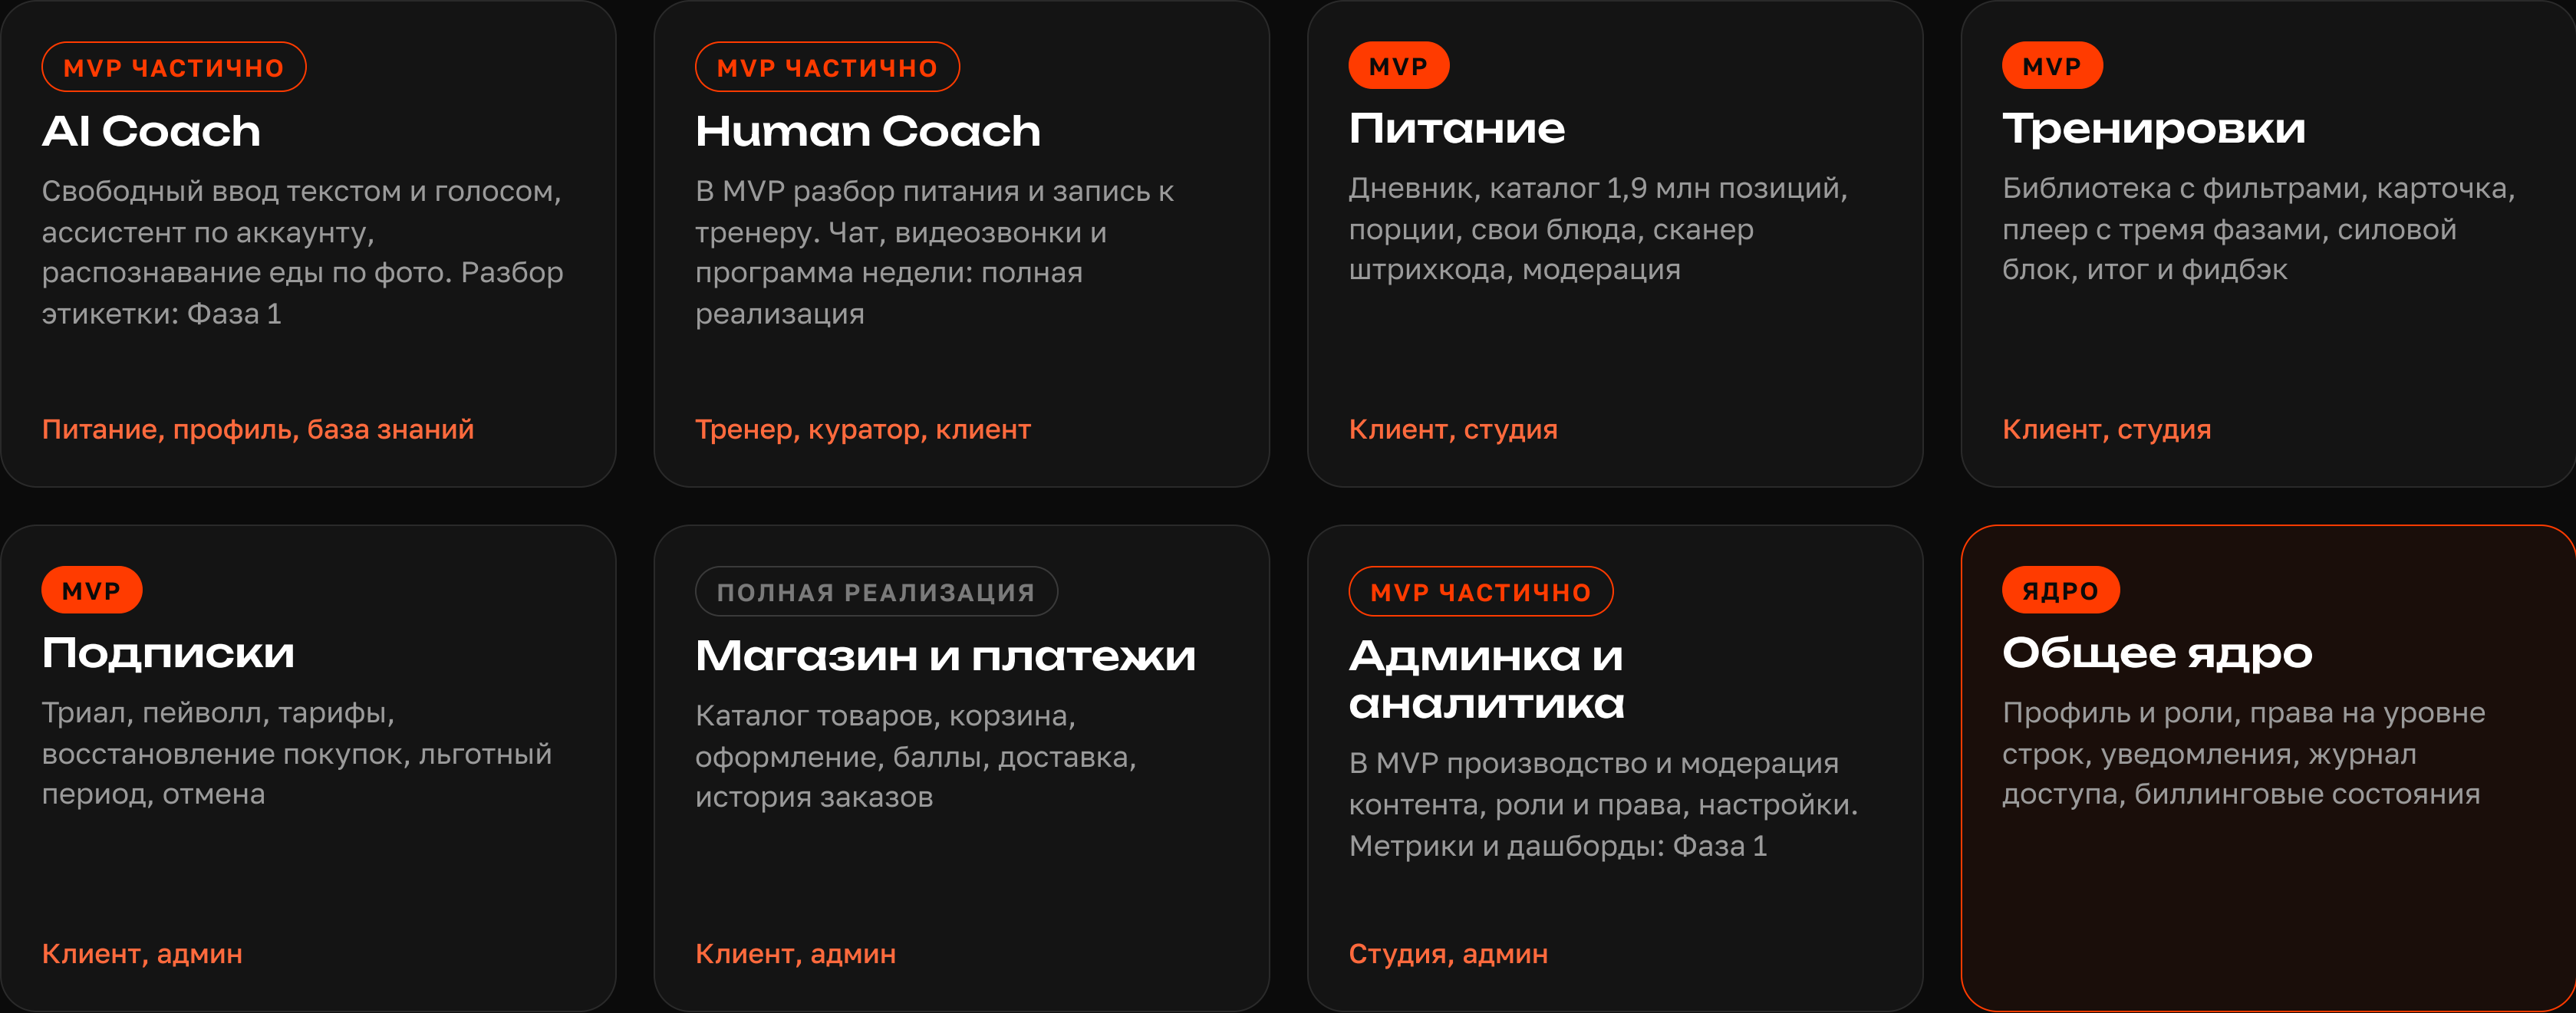

Что входит в MVP и что вынесено

БЛОК	MVP	ФАЗА 1	ПОЛНАЯ
Онбординг и анкета	●	●	●
Тренировки и плеер	●	●	●
Питание и каталог еды	●	●	●
Чек-ин и прогресс	●	●	●
Подписка и пейволл	●	●	●
Кабинеты куратора, студии, админа	●	●	●
AI: свободный ввод и ассистент	●	●	●
AI: распознавание еды по фото	●	●	●
AI-превью результата по фото	●	●	●
AI: разбор этикетки	—	●	●
Силовой дневник	—	●	●
Синхронизация с Health	—	●	●
Продуктовая аналитика и дашборды	—	●	●
Клиентская веб-версия, 26 экранов	—	—	●
Чат и звонки с тренером	—	—	●
Магазин инвентаря и доставка	—	—	●
Кабинет тренера полностью	—	—	●

В MVP три AI-функции

MVP

Свободный ввод текстом и голосом

Фраза вида «съел борщ, два яйца и кофе с молоком» раскладывается в позиции каталога с порциями

НА ЧЁМ РАБОТАЕТ

Каталог еды, модель разбора

ЭФФЕКТ

Снимает половину действий в дневнике

MVP

AI-ассистент по аккаунту

Отвечает на вопросы о расписании, подписке, изменениях плана из данных аккаунта и базы знаний

НА ЧЁМ РАБОТАЕТ

Профиль, подписка, план, база статей

ОГРАНИЧЕНИЕ

Никаких советов по здоровью, спорное уходит человеку

MVP

Распознавание еды по фото

Фотография тарелки превращается в позиции с граммовкой, пользователь правит черновик

НА ЧЁМ РАБОТАЕТ

Готовый сервис распознавания или мультимодальная модель

В MVP

Ответ списком, без разметки на фото. Результат всегда черновик

Разбор этикетки вынесен в Фазу 1: к этому моменту накопится реальная статистика по тому, что и как люди вводят.


Шесть AI-функций по этапам

ФУНКЦИЯ	ЧТО ДЕЛАЕТ	ЭТАП	ОГРАНИЧЕНИЕ
Свободный ввод текстом и голосом	Фраза раскладывается в позиции каталога с порциями	MVP	Снимает половину действий в дневнике
AI-ассистент по аккаунту	Отвечает о расписании, подписке, изменениях плана	MVP	Никаких советов по здоровью
Распознавание еды по фото	Фото тарелки превращается в позиции с граммовкой	MVP	Результат всегда черновик
AI-превью результата по фото	Прогноз внешнего вида после достижения цели	MVP	Отдельная проработка по этике и точности
Разбор этикетки	Фото состава превращается в черновик карточки продукта	ФАЗА 1	Закрывает дыру «приложение не знает мою еду»
Персонализация тона сообщений	Подгоняет уведомления и итоги недели под психотест	ФАЗА 1	Требует модерации шаблонов

Результат распознавания всегда остаётся черновиком, который пользователь подтверждает. Ассистент не даёт советов по здоровью и питанию, любой спорный вопрос переводится на человека. В кабинетах команды AI помечает спорные фото и сливает дубли блюд в базе еды.


Собраны wireframes всех ключевых экранов

БЛОК	ЭКРАНОВ	НУМЕРАЦИЯ	СОДЕРЖАНИЕ
Мобильное приложение, основной флоу	47	F01-F47	Полный путь от приветствия до отмены подписки
Мобильное приложение, вне флоу	2	M08, M10	AI-превью, карусель перед триалом
Клиентская веб-версия	26	W01-W26	Онбординг, тренировки, питание, прогресс, магазин, профиль
Кабинет тренера	7	T1-T7	Клиенты, программа недели, чаты, расписание, питание, заявки, досье
Кабинет куратора	7	K1-K7	Очередь отчётов, карточка клиента, live-мониторинг, психотесты, эскалации
Контент-студия	4	S1-S4	Пайплайн, метаданные, модерация, база еды
Кабинет администратора	11	A1-A10, S8	Метрики, воронки, биллинг, тренеры, магазин, склад, заказы, роли
Итого	104		

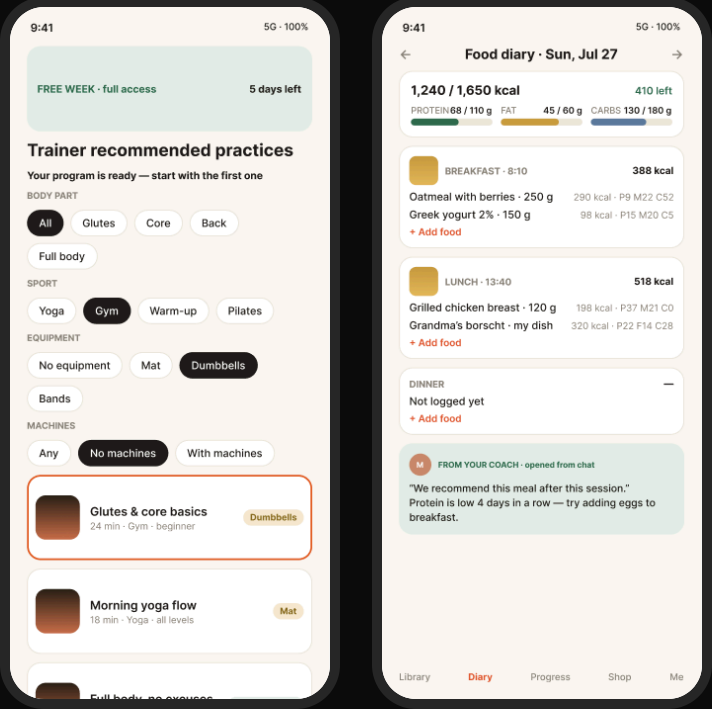

Раскладка, состав блоков, переходы и логика без финального визуала. Макеты сделаны в слоях, а не картинками, поэтому дальше идут в дизайн без пересборки.

Клиенты, ядро платформы и внешние сервисы

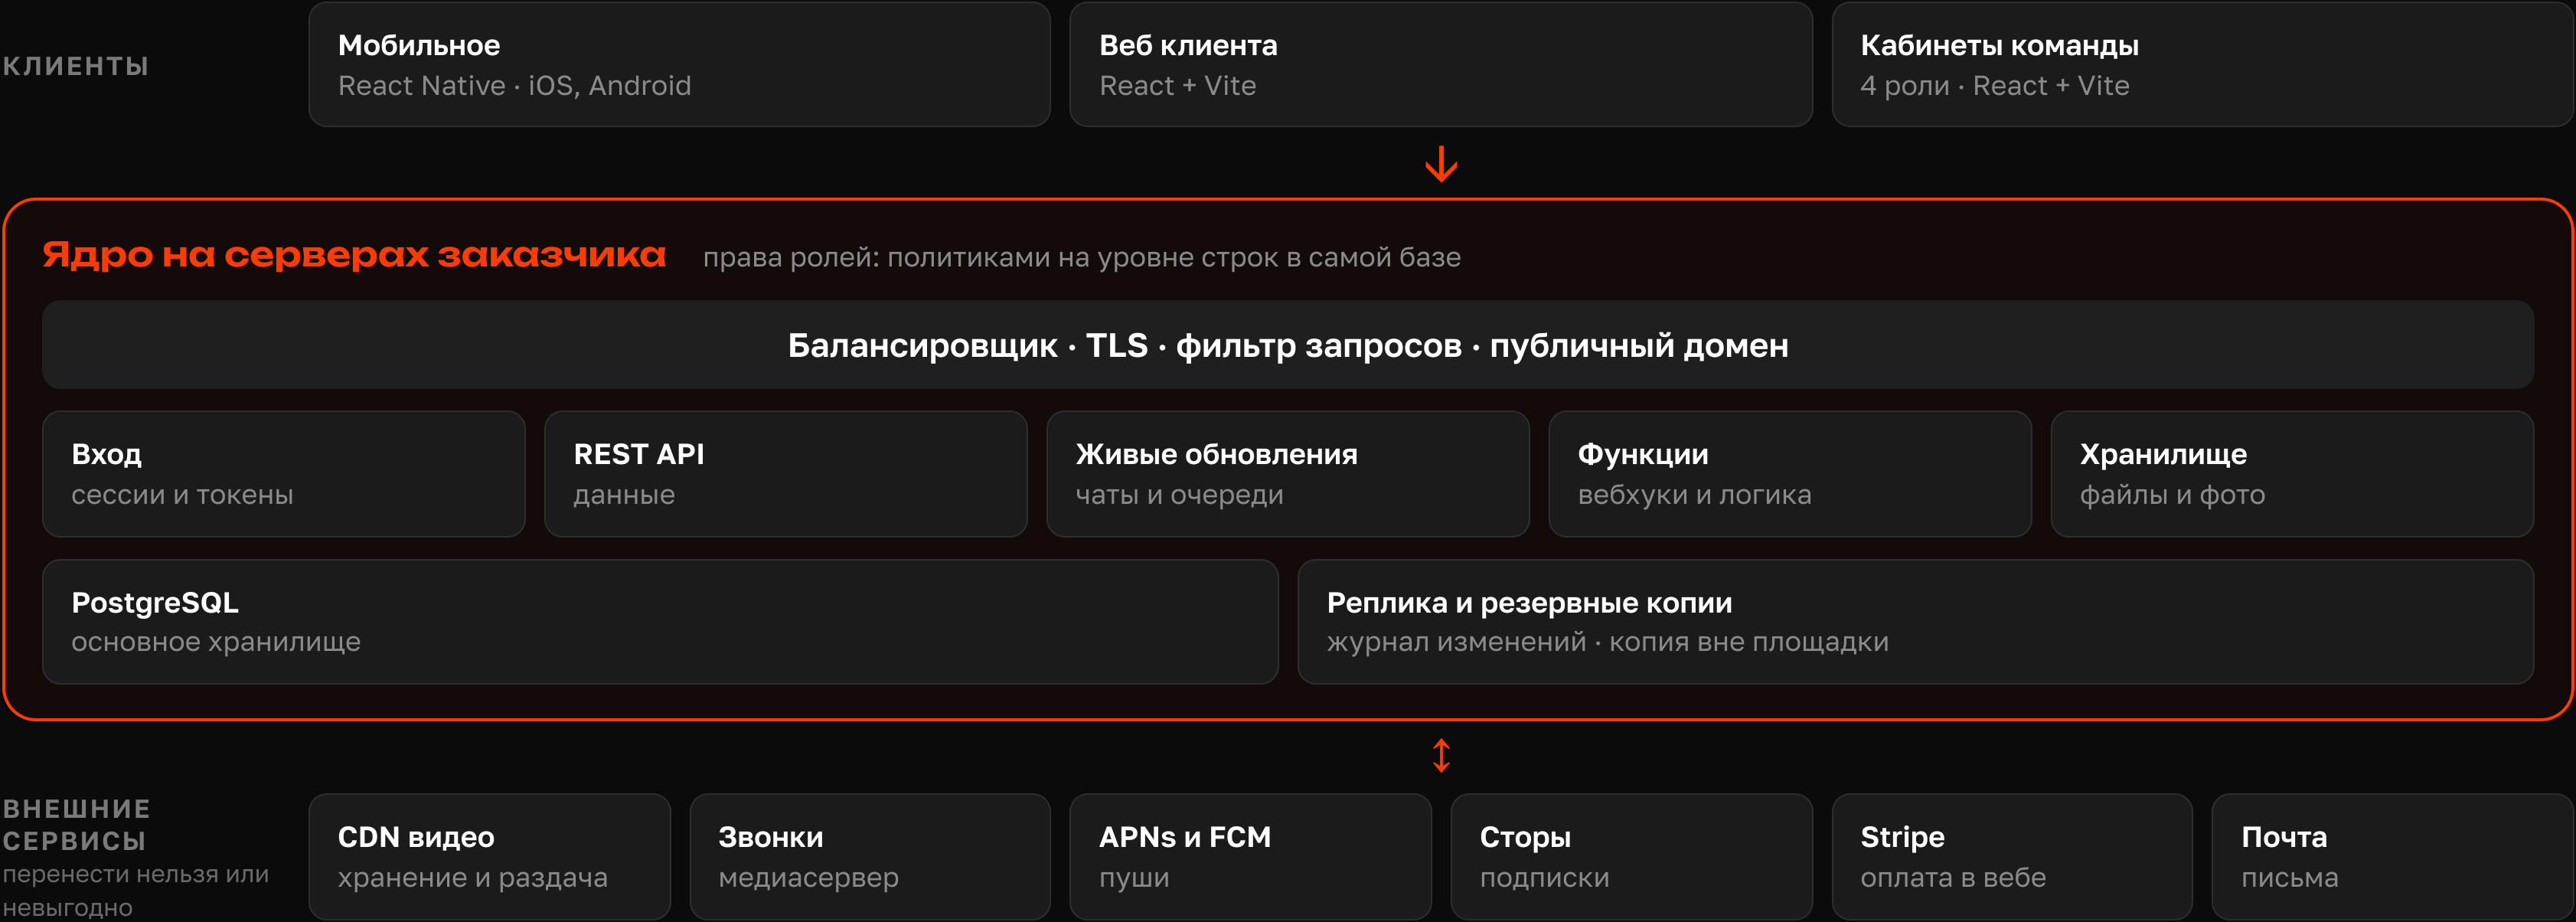

Ядро разворачивается на выделенных серверах заказчика

Клиенты

Мобильное приложение на React Native, одна кодовая база под iOS и Android. Веб-версия клиента и кабинеты команды на React и Vite, всё в одном репозитории: бизнес-логика и клиент к API переиспользуются, различается только слой представления.

Ядро

Открытые компоненты в одном контуре на выделенных серверах заказчика: PostgreSQL, сервис входа и сессий, генератор REST поверх схемы, живые обновления, объектное хранилище, среда серверных функций. Снаружи только то, что перенести нельзя: уведомления, магазины приложений, платежи, видео и звонки.

Почему свои серверы

Платформа работает с показателями здоровья, а в США это:

Washington My Health My Data

с правом частного иска


CCPA и CPRA

Illinois BIPA


для фотографий

Данные о здоровье не покидают периметр заказчика, каждое обращение к ним пишется в журнал.

Четыре зоны с односторонним движением

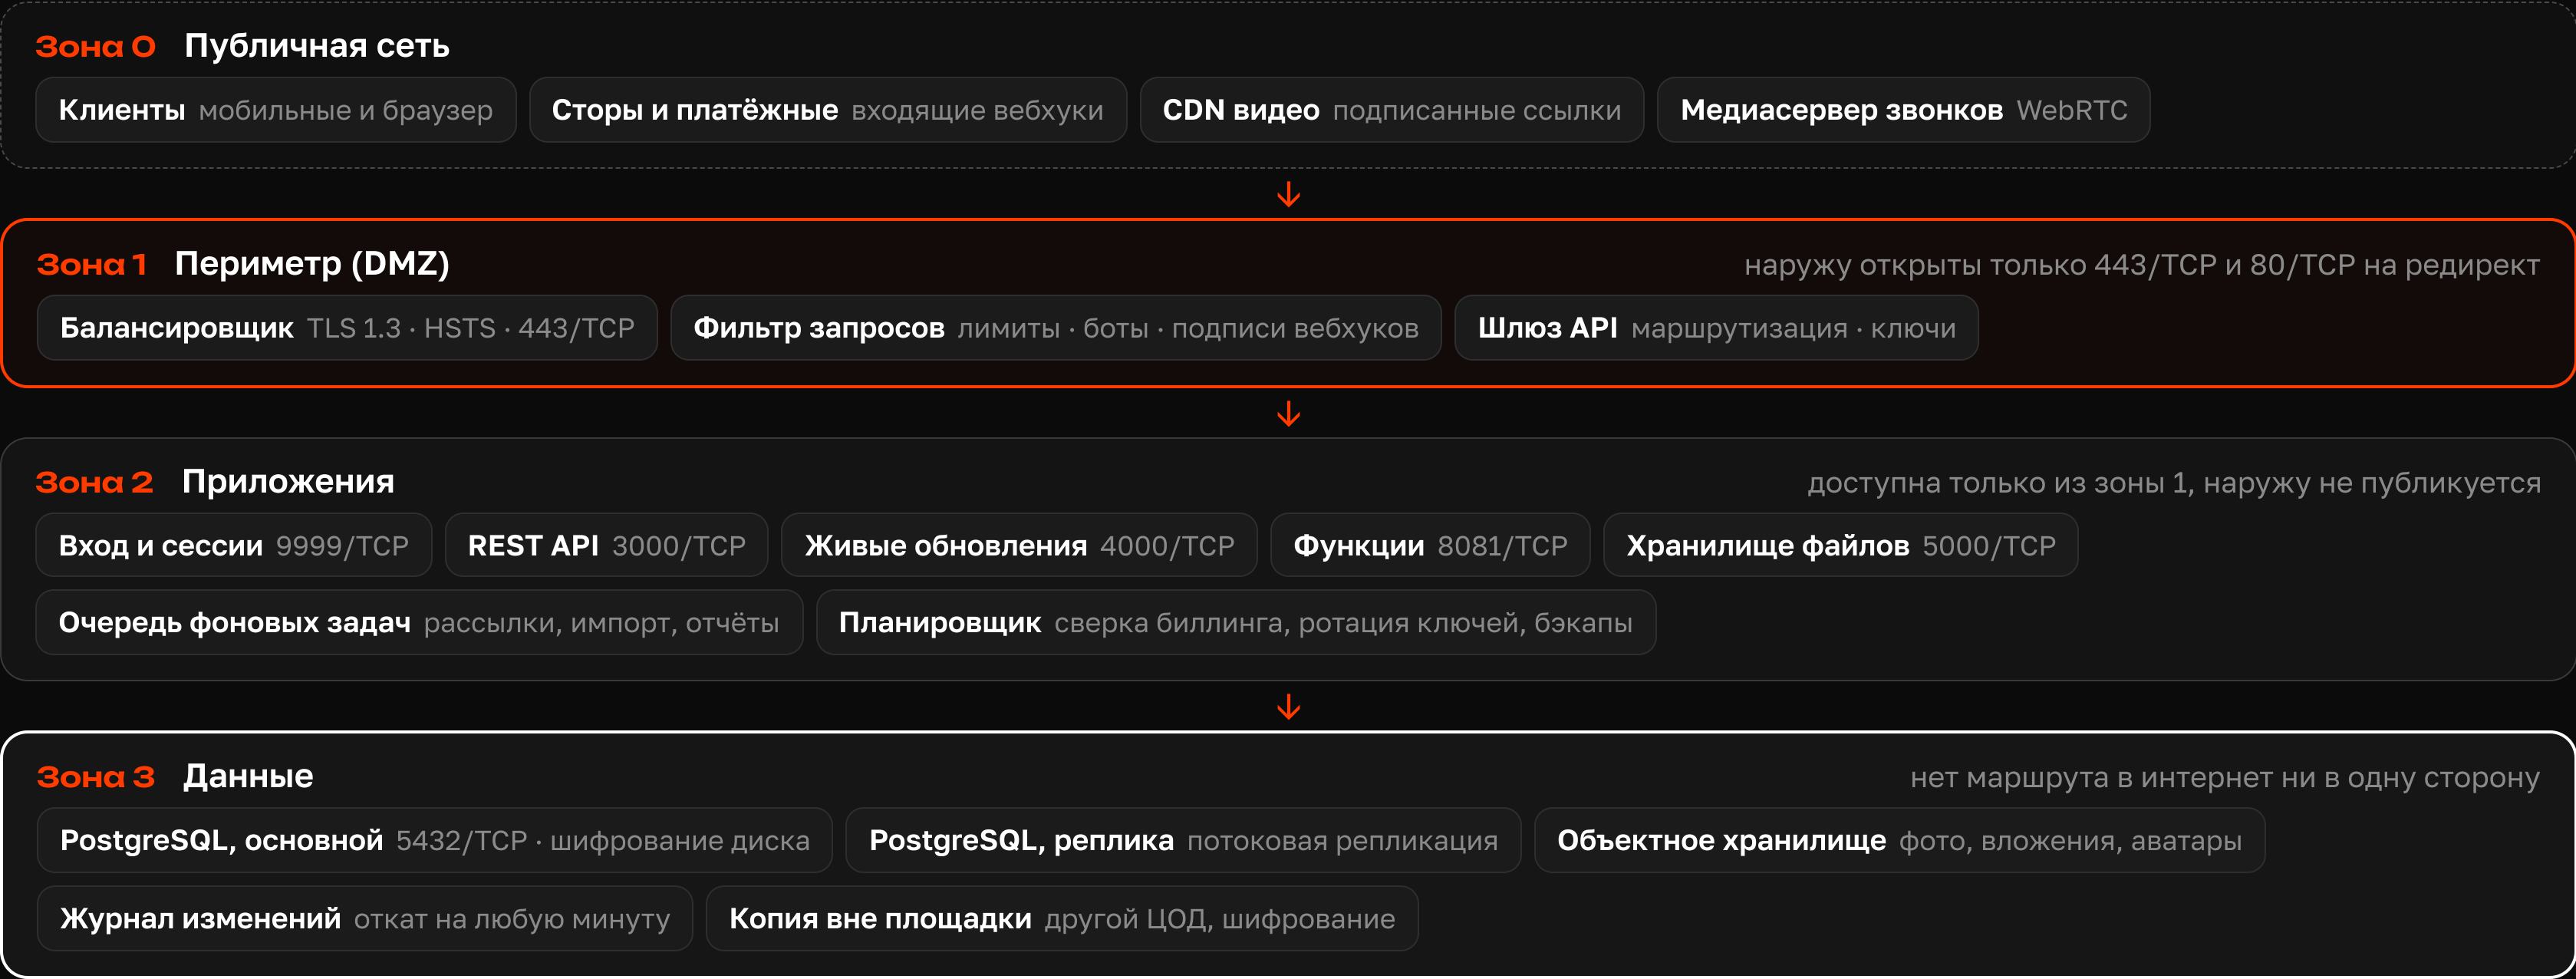

За периметр не уходит ни одна медицинская запись

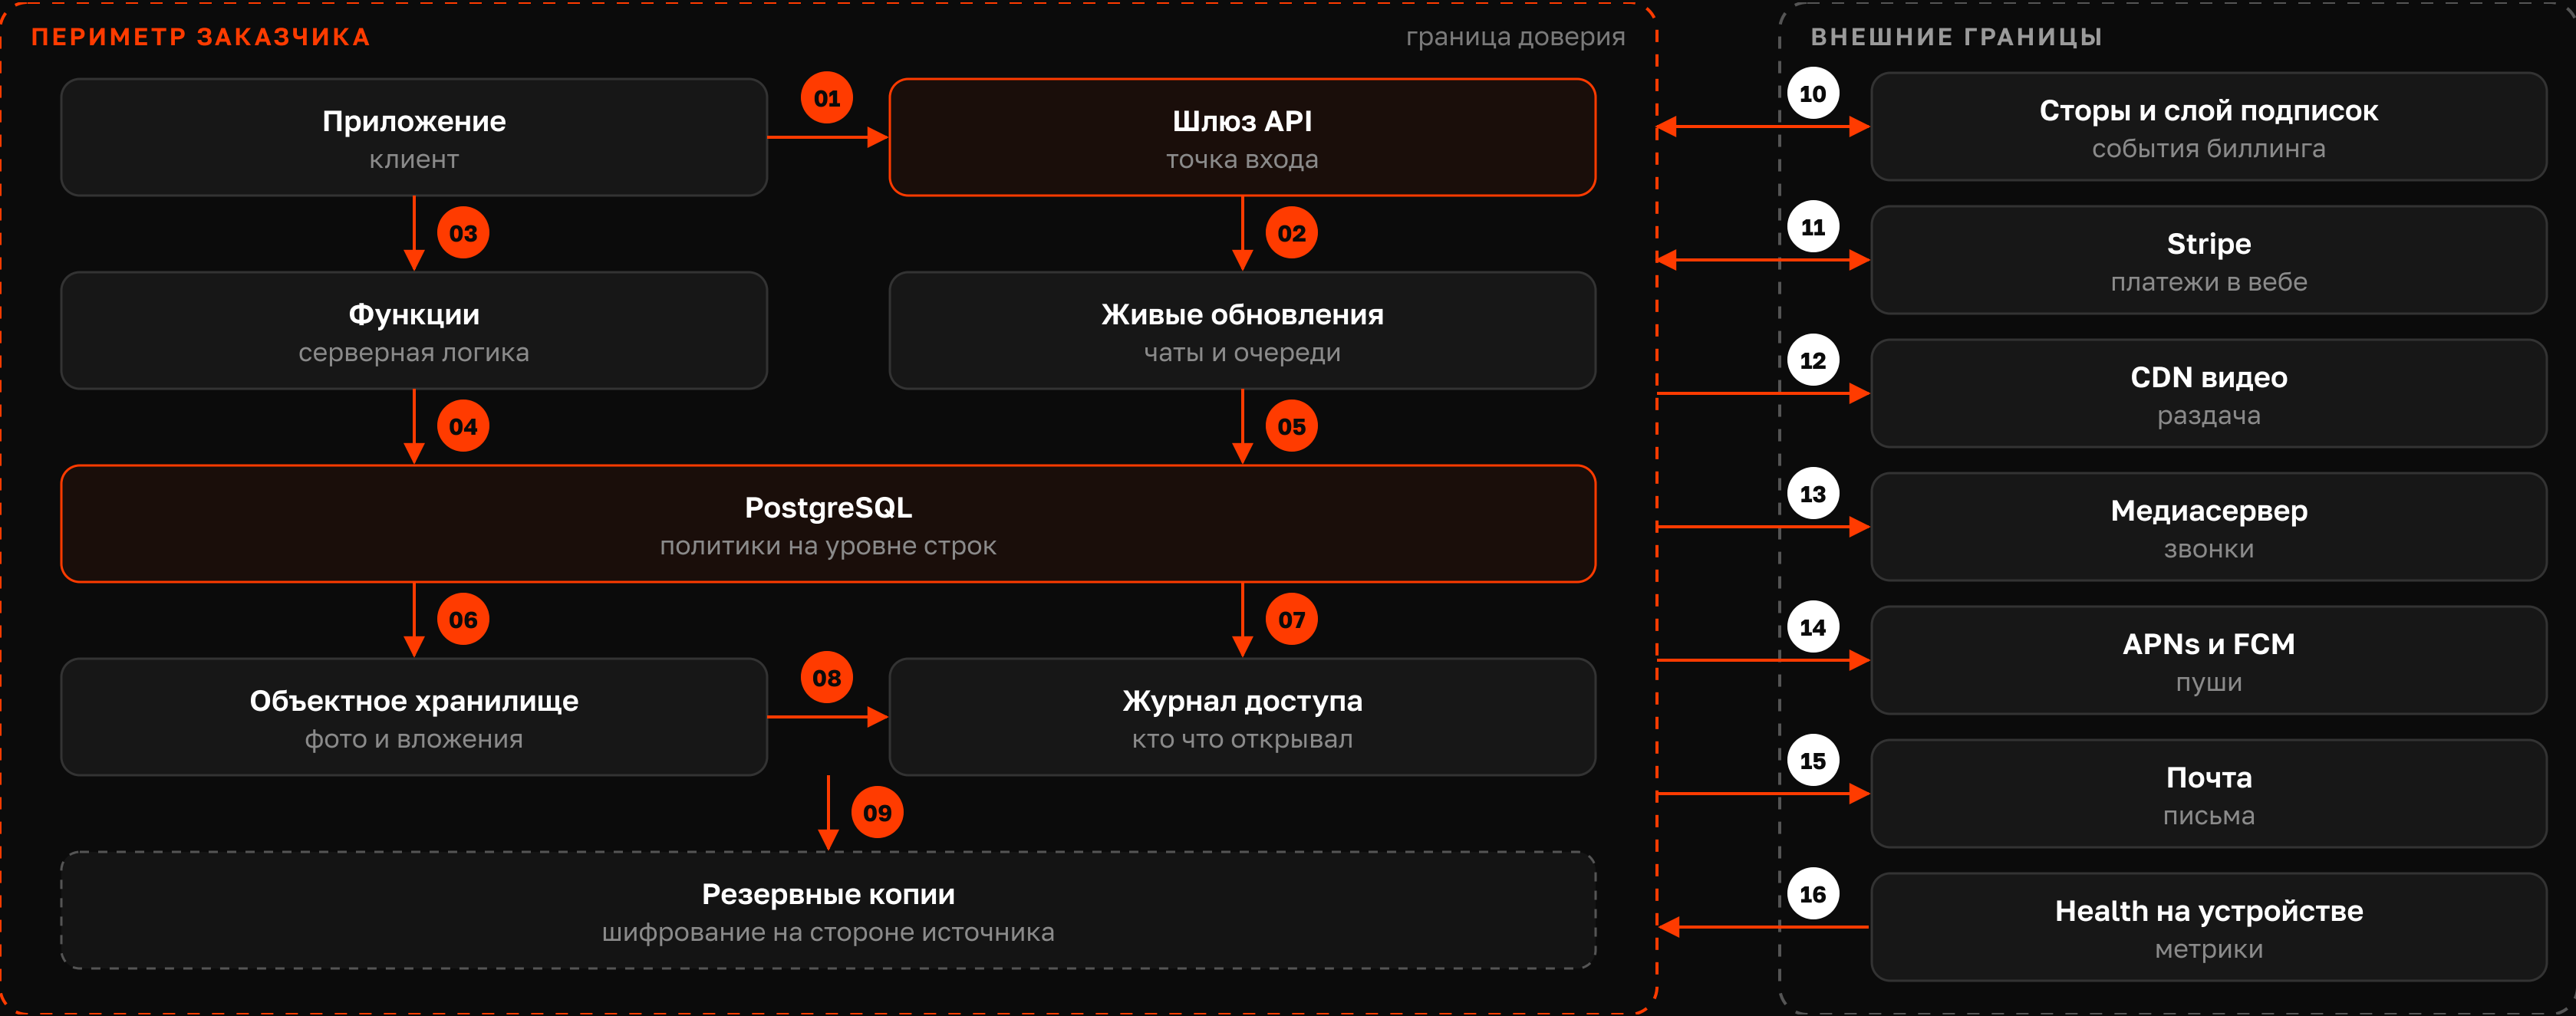


На старте достаточно двух серверов и места под резервные копии

УЗЕЛ	СТАРТ	ЧТО НА НЁМ	РОСТ
Сервер приложения	8 ядер, 16 ГБ, 200 ГБ NVMe	Балансировщик, шлюз, сервисы ядра	2 узла за балансировщиком
Сервер базы	8 ядер, 32 ГБ, 500 ГБ NVMe	PostgreSQL и объектное хранилище	16 ядер, 64 ГБ, 1 ТБ плюс реплика
Хранилище копий	2 ТБ, S3-совместимое	Суточный снимок и журнал изменений	4 ТБ, другой ЦОД

Отказоустойчивая конфигурация добавляет второй сервер приложения, горячую реплику базы и отдельный узел под файлы. Аренда серверов и работы по развёртыванию, отказоустойчивости, мониторингу и регламентам включены в стоимость проекта.

Три релиза

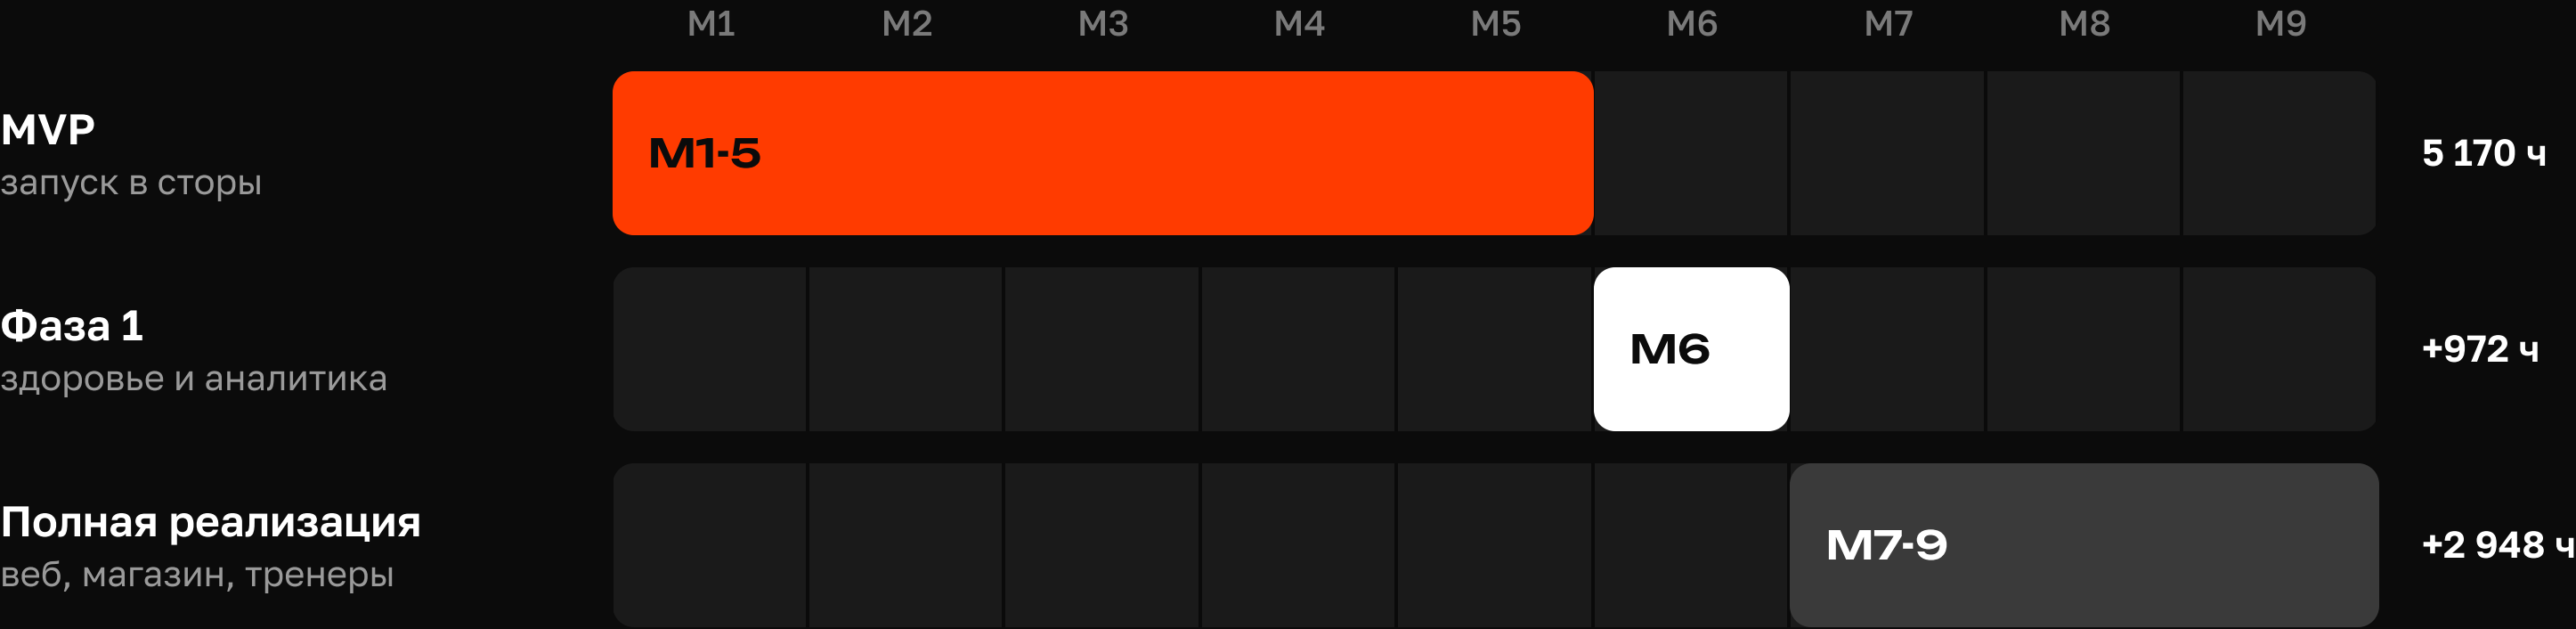

Сроки указаны при команде: 2 бэкенда, 2 React Native, 1 React, 1 QA, дизайнер и менеджер. Второй React-разработчик на полной реализации сокращает срок примерно на месяц.

Три оценки

MVP \$159 331 5 170 ч ≈ 5 месяцев Запуск в сторы: подписка, тренировки, питание, прогресс, кабинеты команды	Фаза 1 \$190 347 6 142 ч ≈ 6 месяцев Накопленным итогом: плюс силовой дневник, синхронизация со здоровьем, аналитика	Полная реализация \$283 123 9 091 ч ≈ 8-9 месяцев Накопленным итогом: плюс клиентская веб-версия, работа с тренером, магазин
---	--	--

Фаза 1 и полная реализация показаны накопленным итогом: это стоимость проекта целиком на соответствующем объёме, а не доплата к предыдущему этапу.

Бюджет по ролям на каждую оценку

роль	\$/ч	MVP, ч	MVP, \$	фаза 1, ч	фаза 1, \$	полная, ч	полная, \$
Дизайн	13,2	269,6	\$3 559	330	\$4 356	533	\$7 036
Бэкенд	35	1 545,5	\$54 093	1 762	\$61 670	2 599,5	\$90 983
React Native	30	1 552,3	\$46 569	1 764	\$52 920	2 546	\$76 380
React, кабинеты	35	712	\$24 920	900	\$31 500	1 400	\$49 000
AI	50	208	\$10 400	309	\$15 450	471	\$23 550
QA	15	360,1	\$5 402	420	\$6 300	520	\$7 800
Менеджмент	35	291,6	\$10 000	354,1	\$12 394	561	\$19 635
Маркетинг	19	231	\$4 389	303	\$5 757	460	\$8 740
Итого		5 170,1	\$159 331	6 142,1	\$190 347	9 090,5	\$283 123

Суммы в долларах США, округлены до целого.

Что не входит в бюджет

01 Сторонние сервисы

Видео, звонки, почта, аналитика, мониторинг: от \$285 в месяц на старте

02 Разовые платежи

Apple Developer Program \$99 в год, Google Play Console \$25

Уже включено в стоимость проекта

Аренда серверов, развёртывание инфраструктуры, отказоустойчивость, мониторинг и регламенты, комиссии

OBGOLTS
edia Group

—darkfactory

FITSTORY · СЕНТЯБРЬ 2026
